

**COMUNE DI COLLIANO**

**PROVINCIA DI SALERNO**


# **Cronoprogramma di ESECUZIONE**

**OGGETTO:** 1) Richiesta Permesso di Costruire in Sanatoria ai sensi art. 36 del D.P.R. n° 380/01 per lavori già eseguiti in difformità al Permesso di Costruire n. 05/16 del 22/03/2016 per la realizzazione di un vano scala per accesso al piano mansarda, ampliamento e realizzazione di un portico al piano terra;  
2) Richiesta Permesso di Costruire ai sensi art. 10 del D.P.R. n° 380/01 per lavori a farsi consistenti nella ristrutturazione edilizia per mutamento di destinazione d'uso da deposito ad abitazione, art. 6 bis comma 1 della L.R. 19/09, al piano mansarda;  
Il tutto ad un fabbricato già esistente alla c/da Pazzano, Comune di Colliano (Sa)

**COMMITTENTE:** Iannarella Carmine


, 28/02/2024


Il Tecnico  
(GEOM. MAURIZIO CARBONE)

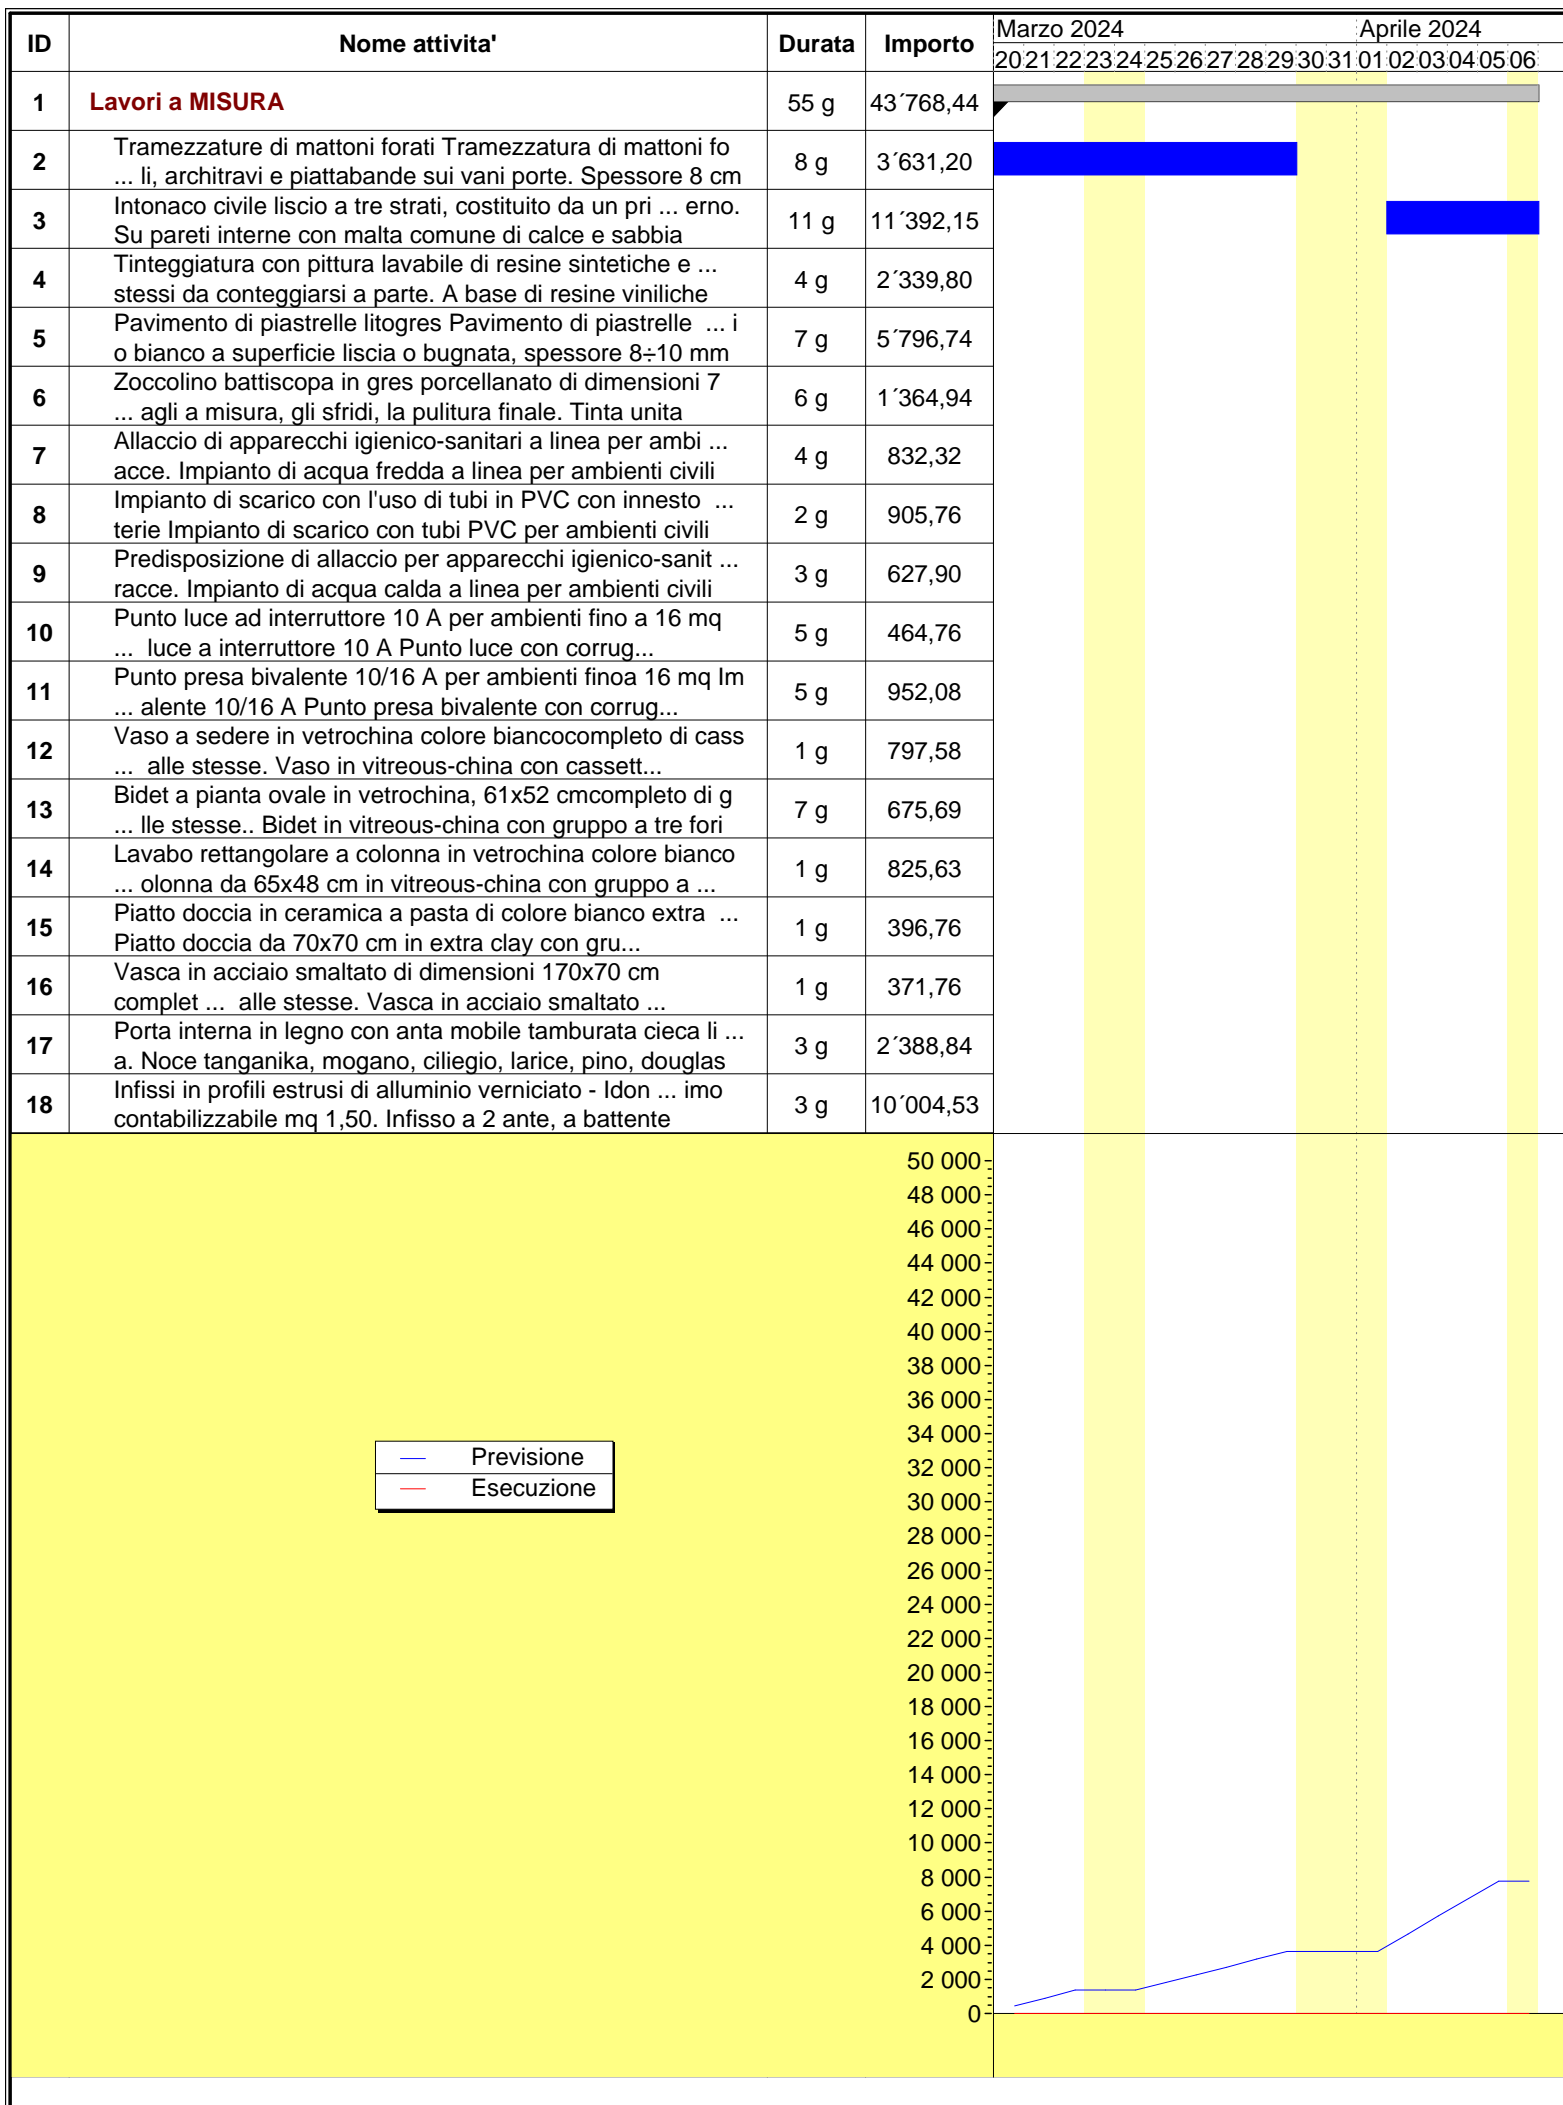

Maggio 2024

070809101112131415161718192021222324252627282930010203040506070809101112131415161718192021222324252627

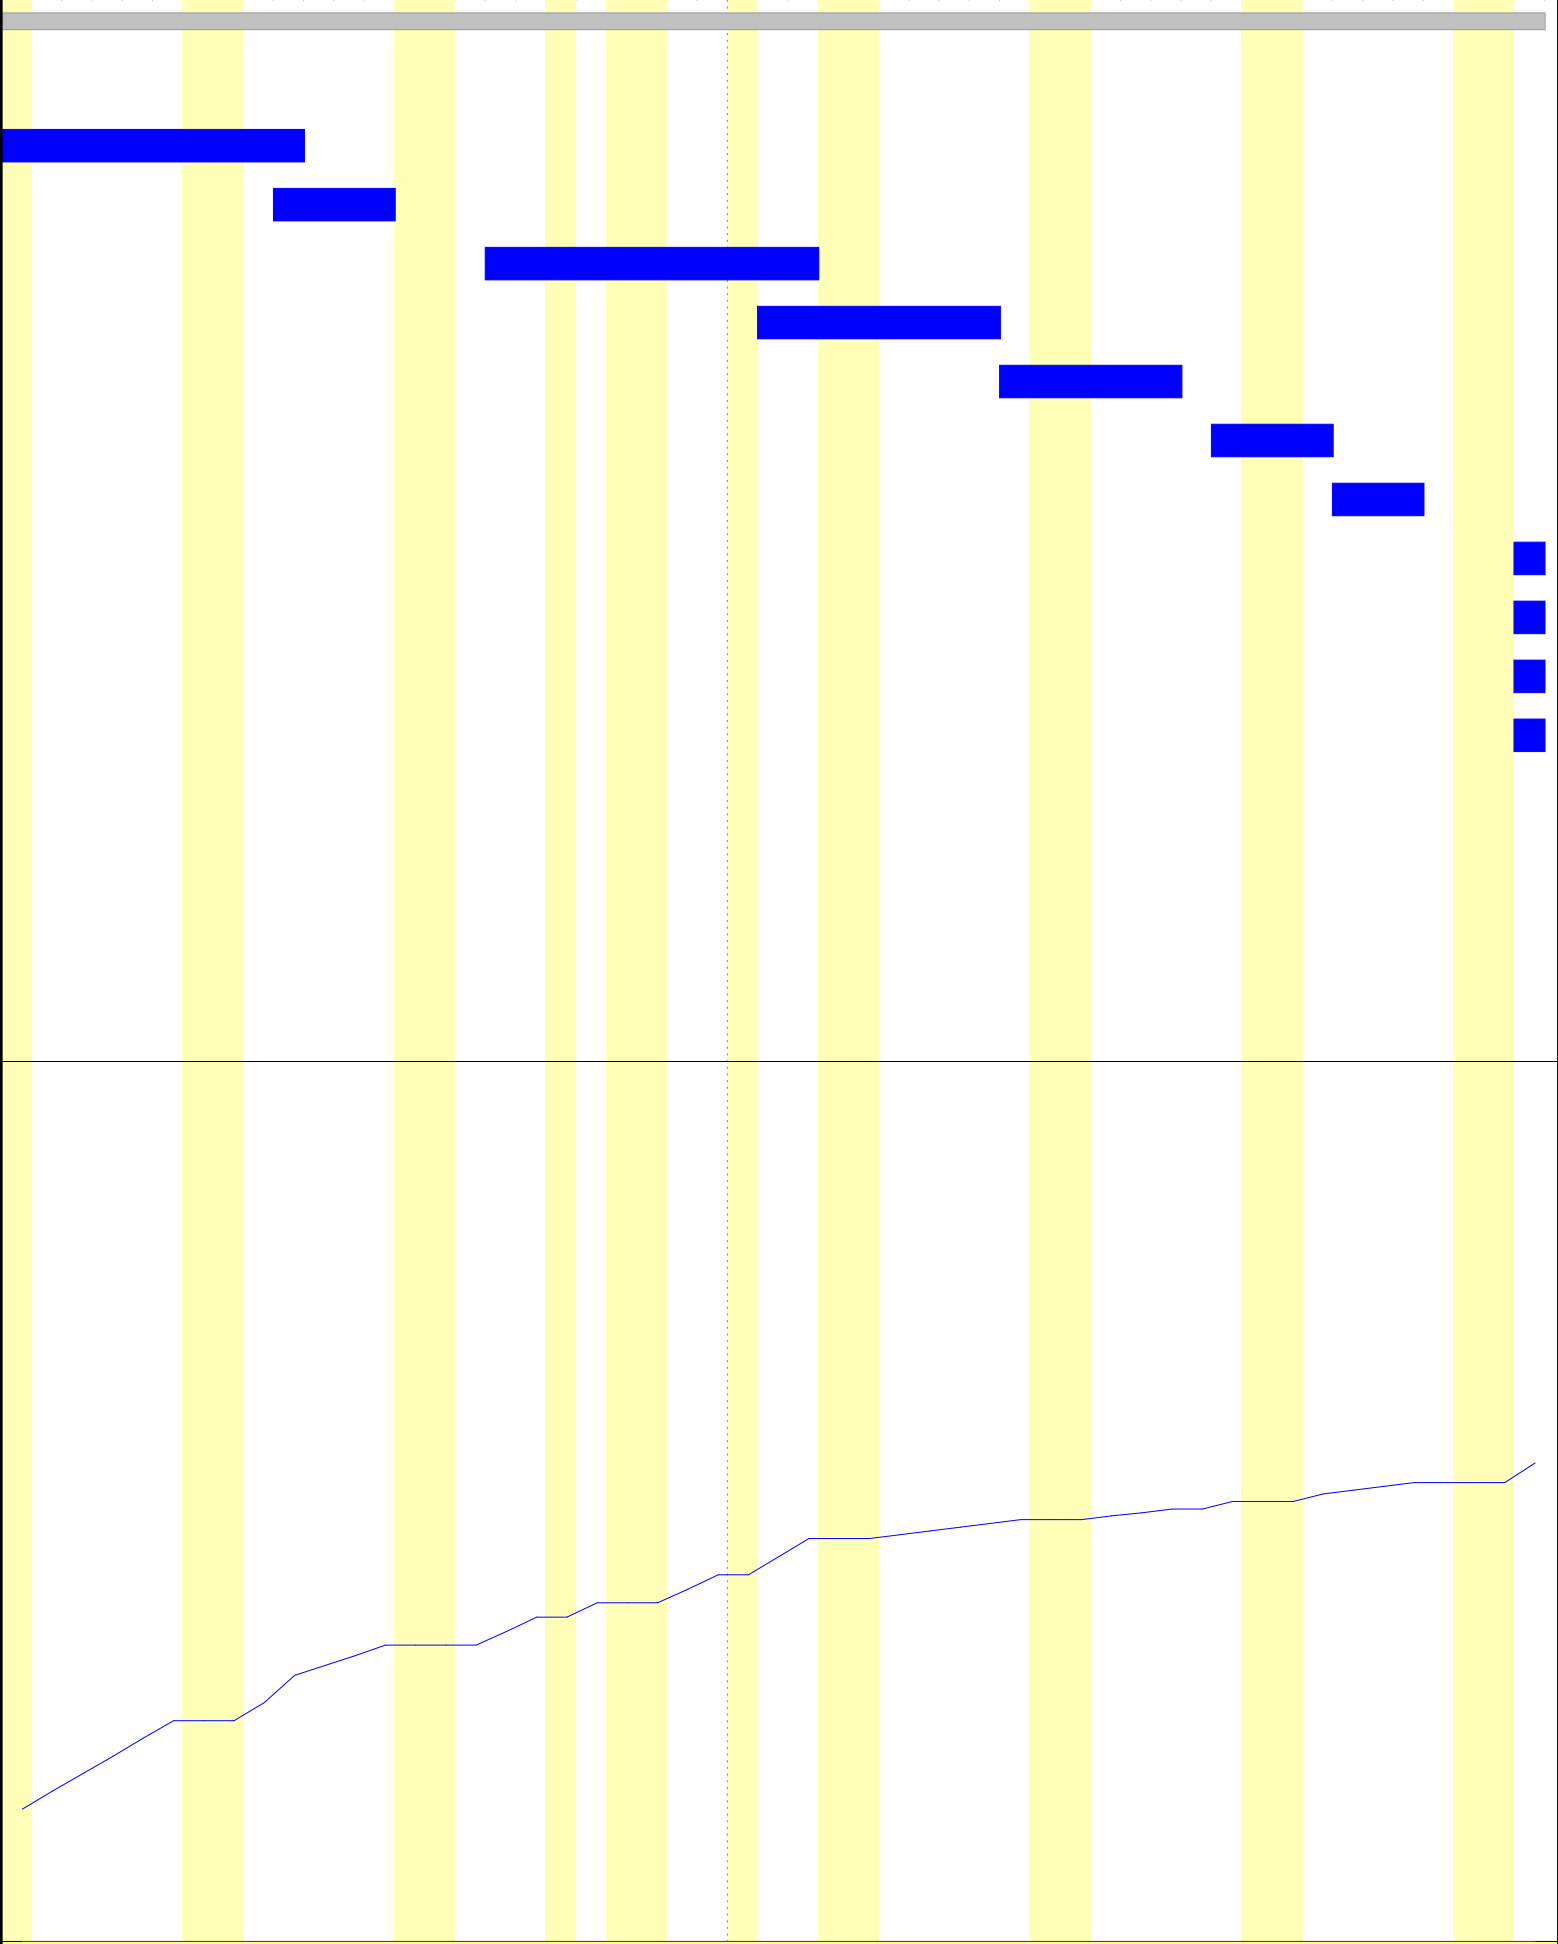

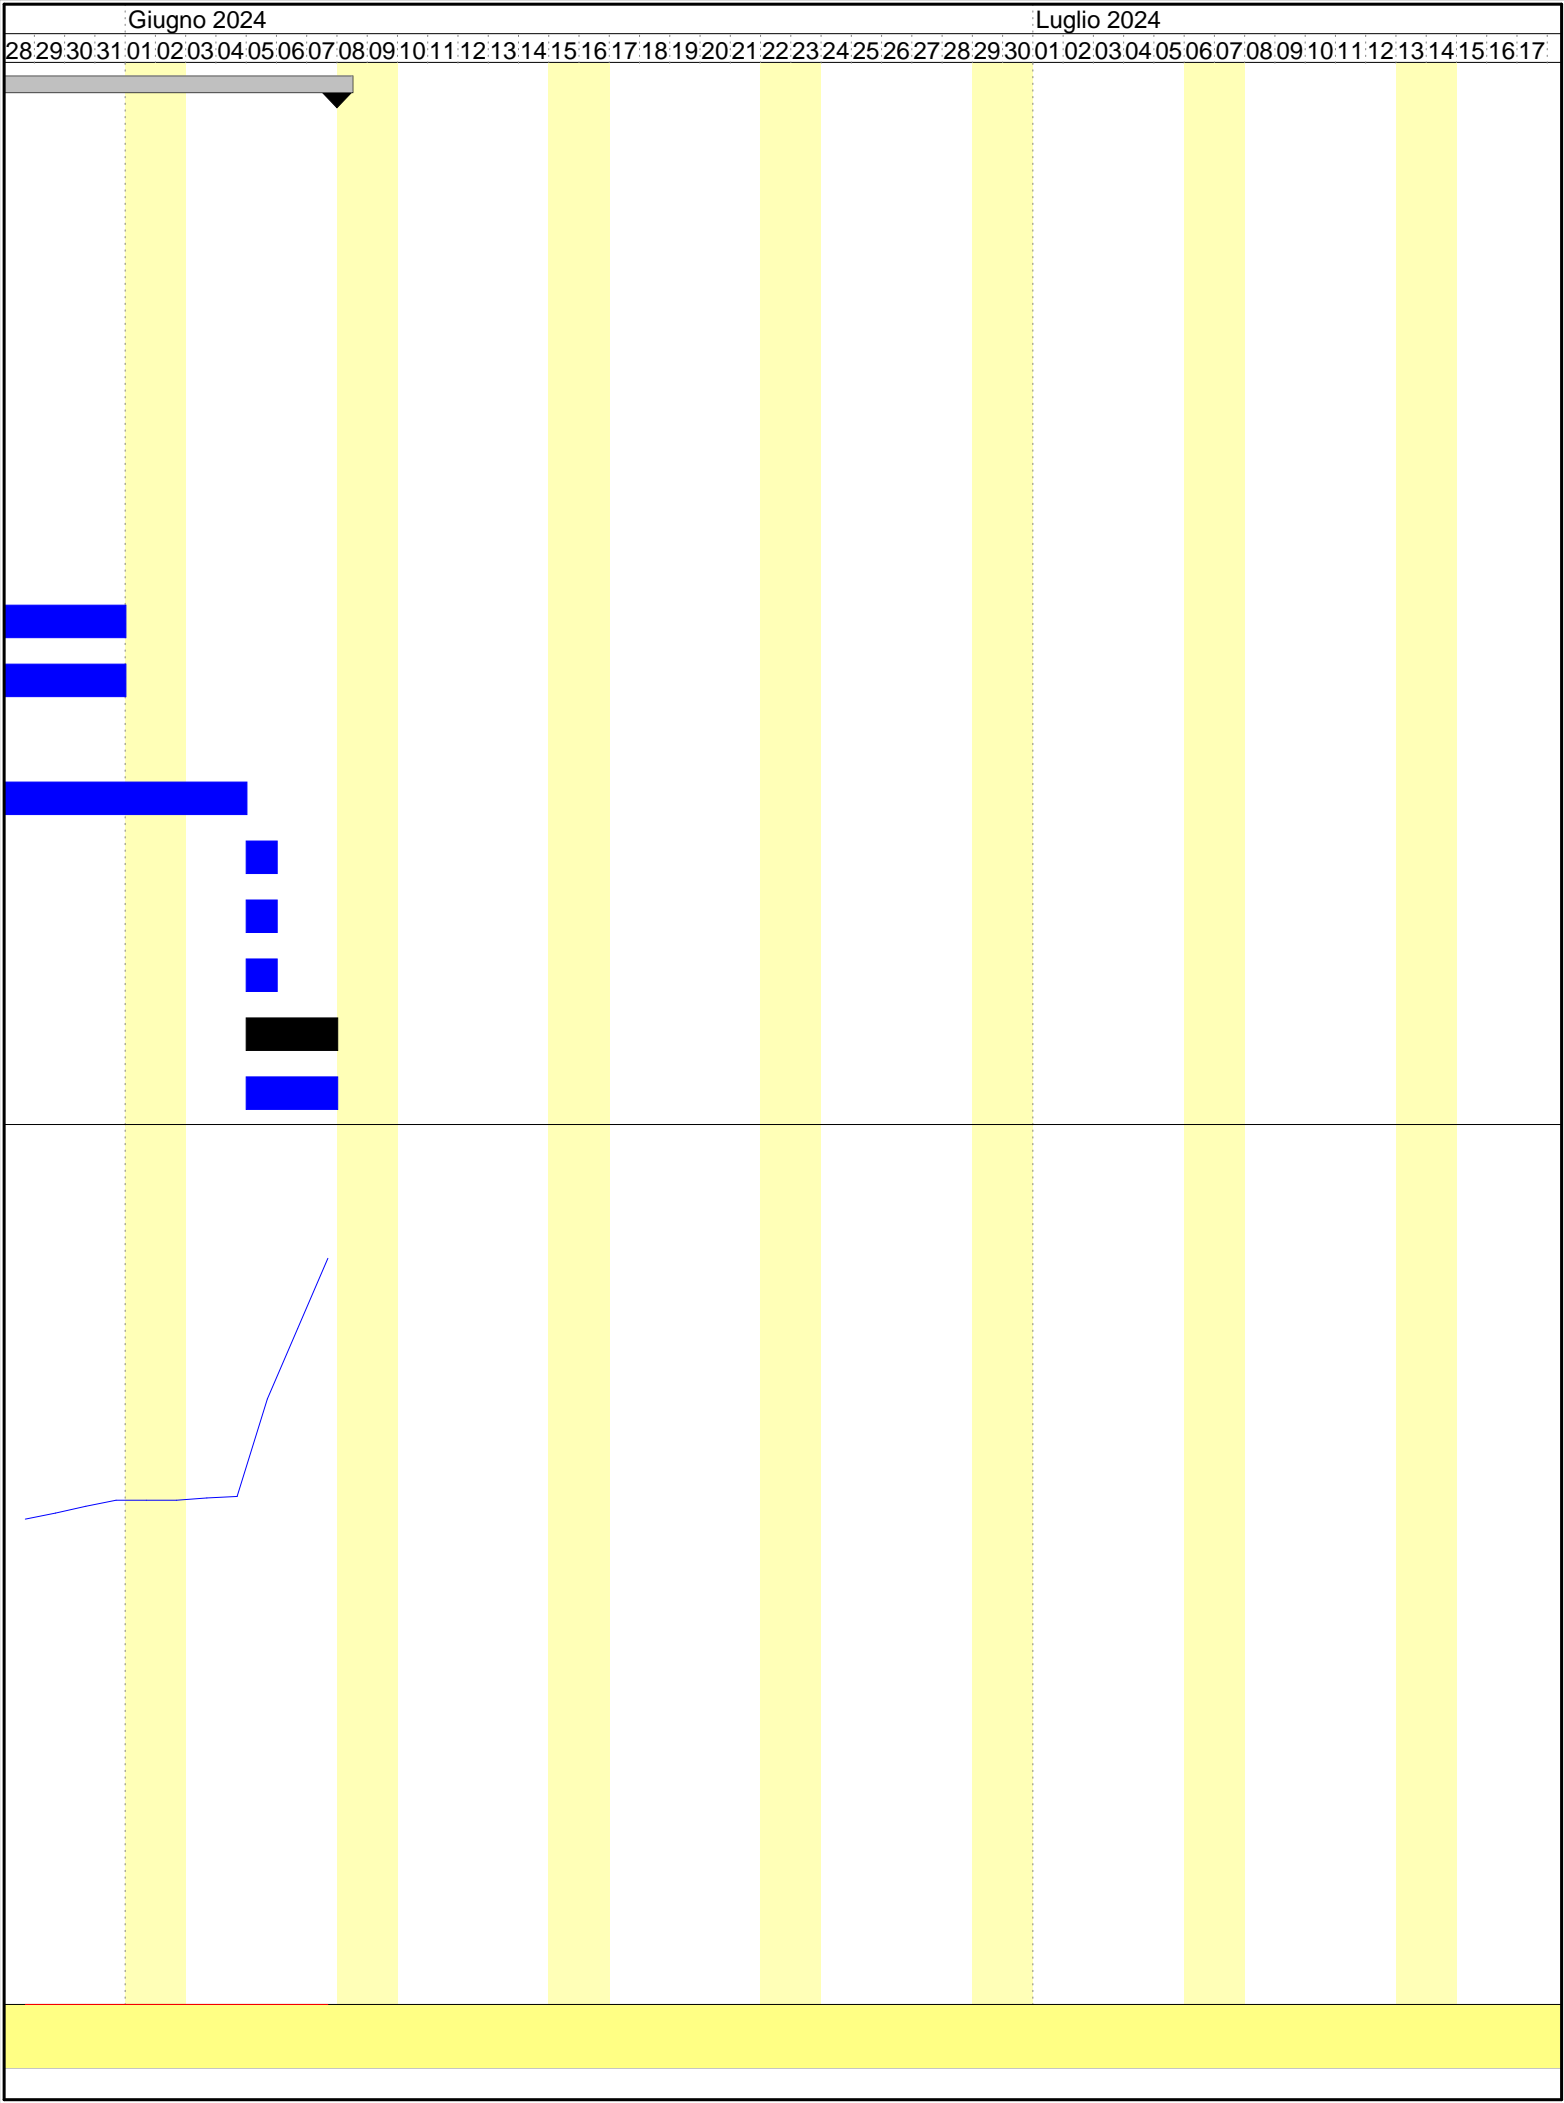

**COMUNE DI COLLIANO**

**PROVINCIA DI SALERNO**

## **Tabella Attività**

**OGGETTO:** 1) Richiesta Permesso di Costruire in Sanatoria ai sensi art. 36 del D.P.R. n° 380/01 per lavori già eseguiti in difformità al Permesso di Costruire n. 05/16 del 22/03/2016 per la realizzazione di un vano scala per accesso al piano mansarda, ampliamento e realizzazione di un portico al piano terra;  
2) Richiesta Permesso di Costruire ai sensi art. 10 del D.P.R. n° 380/01 per lavori a farsi consistenti nella ristrutturazione edilizia per mutamento di destinazione d'uso da deposito ad abitazione, art. 6 bis comma 1 della L.R. 19/09, al piano mansarda;  
Il tutto ad un fabbricato già esistente alla c/da Pazzano, Comune di Colliano (Sa)

**COMMITTENTE:** Iannarella Carmine

, 28/02/2024

Il Tecnico  
(GEOM. MAURIZIO CARBONE)

---

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
<b>Lavori a MISURA</b>	<b>43'768,44</b>	<b>100,000</b>	<b>20/03/2024</b>	<b>07/06/2024</b>	<b>55</b>	<b>80</b>
* Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni fo ... li, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore 8 cm	3'631,20	8,296	20/03/2024	29/03/2024	8	10
* Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un pri ... erno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia	11'392,15	26,028	02/04/2024	16/04/2024	11	15
* Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche e ... stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine viniliche	2'339,80	5,346	16/04/2024	19/04/2024	4	4
* Pavimento di piastrelle litogres Pavimento di piastrelle ... i o bianco a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm	5'796,74	13,244	23/04/2024	03/05/2024	7	11
* Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7 ... agli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Tinta unita	1'364,94	3,119	02/05/2024	09/05/2024	6	8
* Allaccio di apparecchi igienico-sanitari a linea per ambi ... acce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili	832,32	1,902	10/05/2024	15/05/2024	4	6
* Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto ... terie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili	905,76	2,069	17/05/2024	20/05/2024	2	4
* Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanit ... racce. Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili	627,90	1,435	21/05/2024	23/05/2024	3	3
* Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq ... luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero	464,76	1,062	27/05/2024	31/05/2024	5	5
* Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti fino a 16 mq Im ... alente 10/16 A Punto presa bivalente con corrugato leggero	952,08	2,175	27/05/2024	31/05/2024	5	5
* Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cass ... alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta a parete	797,58	1,822	27/05/2024	27/05/2024	1	1
* Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cmcompleto di g ... lle stesse.. Bidet in vitreous-china con gruppo a tre fori	675,69	1,544	27/05/2024	04/06/2024	7	9
* Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco ... olonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo a tre fori	825,63	1,886	05/06/2024	05/06/2024	1	1
* Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra ... Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso	396,76	0,906	05/06/2024	05/06/2024	1	1
* Vasca in acciaio smaltato di dimensioni 170x70 cm complet ... alle stesse. Vasca in acciaio smaltato con gruppo esterno	371,76	0,849	05/06/2024	05/06/2024	1	1
* Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca li ... a. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas	2'388,84	5,458	05/06/2024	07/06/2024	3	3
* Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idon ... imo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	10'004,53	22,858	05/06/2024	07/06/2024	3	3
Data, 28/02/2024						
<b>Tecnico</b> GEOM. MAURIZIO CARBONE						

**COMUNE DI COLLIANO**

**PROVINCIA DI SALERNO**

## **Tabella Date e Importi**

**OGGETTO:** 1) Richiesta Permesso di Costruire in Sanatoria ai sensi art. 36 del D.P.R. n° 380/01 per lavori già eseguiti in difformità al Permesso di Costruire n. 05/16 del 22/03/2016 per la realizzazione di un vano scala per accesso al piano mansarda, ampliamento e realizzazione di un portico al piano terra;  
2) Richiesta Permesso di Costruire ai sensi art. 10 del D.P.R. n° 380/01 per lavori a farsi consistenti nella ristrutturazione edilizia per mutamento di destinazione d'uso da deposito ad abitazione, art. 6 bis comma 1 della L.R. 19/09, al piano mansarda;  
Il tutto ad un fabbricato già esistente alla c/da Pazzano, Comune di Colliano (Sa)

**COMMITTENTE:** Iannarella Carmine

, 28/02/2024

Il Tecnico  
(GEOM. MAURIZIO CARBONE)

---

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
20/03/2024	453,90	453,90	1,037
21/03/2024	453,90	907,80	2,074
22/03/2024	453,90	1'361,70	3,111
25/03/2024	453,90	1'815,60	4,148
26/03/2024	453,90	2'269,50	5,185
27/03/2024	453,90	2'723,40	6,222
28/03/2024	453,90	3'177,30	7,259
29/03/2024	453,90	3'631,20	8,296
02/04/2024	1'035,65	4'666,85	10,663
03/04/2024	1'035,65	5'702,50	13,029
04/04/2024	1'035,65	6'738,15	15,395
05/04/2024	1'035,65	7'773,80	17,761
08/04/2024	1'035,65	8'809,45	20,127
09/04/2024	1'035,65	9'845,10	22,494
10/04/2024	1'035,65	10'880,75	24,860
11/04/2024	1'035,65	11'916,40	27,226
12/04/2024	1'035,65	12'952,05	29,592
15/04/2024	1'035,65	13'987,70	31,958
16/04/2024	1'620,60	15'608,30	35,661
17/04/2024	584,95	16'193,25	36,998
18/04/2024	584,95	16'778,20	38,334
19/04/2024	584,95	17'363,15	39,670
23/04/2024	828,11	18'191,26	41,562
24/04/2024	828,11	19'019,36	43,455
26/04/2024	828,11	19'847,47	45,347
29/04/2024	828,11	20'675,57	47,239
30/04/2024	828,11	21'503,68	49,131
02/05/2024	1'055,59	22'559,27	51,542
03/05/2024	1'055,60	23'614,87	53,954
06/05/2024	227,49	23'842,36	54,474
07/05/2024	227,49	24'069,85	54,994
08/05/2024	227,49	24'297,34	55,513
09/05/2024	227,49	24'524,83	56,033
10/05/2024	208,08	24'732,91	56,509
13/05/2024	208,08	24'940,99	56,984
14/05/2024	208,08	25'149,07	57,459
15/05/2024	208,08	25'357,15	57,935
17/05/2024	452,88	25'810,03	58,970
20/05/2024	452,88	26'262,91	60,004
21/05/2024	209,30	26'472,21	60,482
22/05/2024	209,30	26'681,51	60,961
23/05/2024	209,30	26'890,81	61,439
27/05/2024	1'177,48	28'068,28	64,129
28/05/2024	379,90	28'448,18	64,997
29/05/2024	379,90	28'828,07	65,865
30/05/2024	379,90	29'207,97	66,733
31/05/2024	379,90	29'587,87	67,601
03/06/2024	96,53	29'684,39	67,821
04/06/2024	96,53	29'780,92	68,042
05/06/2024	5'725,27	35'506,20	81,123
06/06/2024	4'131,12	39'637,32	90,561
07/06/2024	4'131,12	43'768,44	100,000
Data, 28/02/2024			
<p style="text-align: center;"><b>Tecnico</b> GEOM. MAURIZIO CARBONE</p>			
